



**INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL**  
Guatemala, C.A.  
Unidad Especial de Ejecución  
Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia  
Préstamo BCIE 2181



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL  
*Defendamos con valentía, defendamos con paciencia*

Guatemala, 12 de mayo de 2025  
Ref.: UEEP-PIMSJ-BCIE2181/Coordinación/JRHJ/lfa  
Oficio No. 009-2025


Licenciado  
**Byron Estuardo Morales López**  
Encargado en funciones  
Información Pública  
Instituto de la Defensa Pública Penal  
Su Despacho


Estimado Lic. Morales:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos al frente de sus labores diarias.

En cumplimiento a la instrucción emanada en el **Artículo 73. Planes de Ejecuciones Anuales de Préstamos Externos**, del Decreto 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco (2025). En ese sentido se adjunta en formato impreso el **PLAN ANUAL DE EJECUCION** correspondiente al **MES DE ABRIL 2025** del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, préstamo BCIE 2181, en proceso de ejecución por el instituto de la Defensa Pública Penal, se adjunta un CD que contiene el formato PDF, el informe a publicar. Esperando que la información sea de utilidad para el seguimiento de ustedes.

Sin otro particular, nos suscribimos. Atentamente,

  
Ing. Jaime Raúl Hernández Juárez  
Coordinador de la Unidad  
Unidad Especial de Ejecución Programa  
de Inversión y Modernización para el Sector Justicia  
Préstamo BCIE 2181.

  
Licda. Carolina Ochoa Cetino  
Directora  
División Administrativa y Financiera  
Instituto de la Defensa Pública Penal  
Guatemala, Guatemala 067

Cc Archivo



# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Abril / 2025**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA**


Organismo ejecutor: **Instituto de la Defensa Pública Penal**

Número de Préstamo	BCIE-2181	Fecha de última actualización	09/05/2025
Código Presupuestario	5204010071	Fecha del Decreto	20/05/2020
Organismo Financiero	BCIE	Fecha de Suscripción	20/05/2020
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	20/05/2020
Monto contratado	300,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	28/12/2020
Monto contratado Entidad ejecutora	20,000,000.00	Fecha de cierre actual	20/05/2026
Monto Entidad Ejecutora Dolares	20,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	153,872,000.00	Plazo de ejecución	83.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,085,573.94 10.43%	Monto por desembolsar USD\$	17,914,426.06 89.57%

**Gráfica de Ejecución**

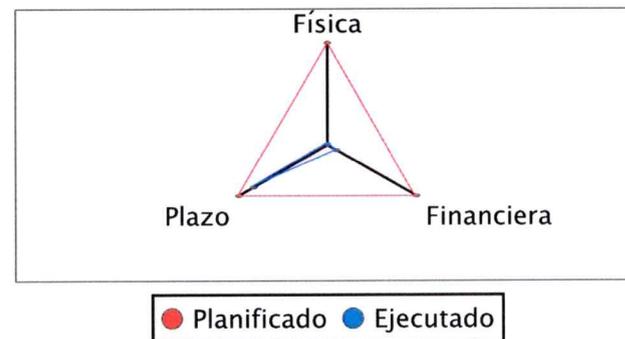

Tipo de cambio: 7.6936 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Abril		Indicadores de Avance Anuales 2025		Total	
<b>Asignación Presupuestaria anual</b>	29,400,000.00	<b>Desembolso planificado en el mes</b>	2,500,000.00	<b>Desembolsos Acumulados del Año</b>	0	<b>Ejecución Financiera</b>	0.00%
<b>Presupuesto Vigente anual</b>	29,400,000.00	<b>Desembolso realizado en el mes</b>	0.00	<b>Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos</b>	0.00% / 50.00%		
<b>Presupuesto Devengado</b>	277,704.03	<b>Diferencia</b>	2,500,000.00	<b>Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados</b>	0.00% / 0.00%		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	0.95%	<b>Próximo desembolso del mes</b>	Octubre	<b>Plazo de ejecucion Actual</b>	83.00%		
		<b>Presupuesto planificado próximo</b>	2,500,000.00	<b>Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual</b>	5.8800		

## Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Administración</b>									
Personal Contratado UEE	Unidad	0		1		0		1	
<b>Componente: Supervisión</b>									
Supervisores Contratados	Unidad	1	1	2		3		6	1
<b>Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>									
Construcción de Sedes Departamentales	Unidad	0		0		1		1	
Construcción de Sedes Municipales	Unidad	1		1		1		3	
Equipamiento de Sedes Municipales	Unidad	0		1		2		3	
Construcción Edificio Sede Central	Unidad	0		0		1		1	
Equipamiento de Sede Departamental	Unidad	0		0		1		1	

003



## Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Administración</b>											
<b>Personal Contratado UEE</b>											
Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP (CC-23)	Comparación de Precios o Calificaciones	31/01/2025		24/02/2025		10/03/2025		25/03/2025		01/04/2025	
<b>Supervisión</b>											
<b>Supervisores Contratados</b>											
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-10)	Comparación de Precios o Calificaciones	03/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		08/12/2025		22/12/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-11)	Comparación de Precios o Calificaciones	03/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		08/12/2025		22/12/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento de Quetzaltenango (CC-12)	Comparación de Precios o Calificaciones	06/10/2025		13/10/2025		27/10/2025		10/11/2025		24/11/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque (CC-13)	Comparación de Precios o Calificaciones	19/08/2024	19/08/2024	26/09/2024	26/09/2024	21/10/2024	21/10/2024	20/01/2025	28/01/2025	24/02/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede	Comparación de Precios o Calificaciones	28/01/2025		25/02/2025		17/03/2025		28/03/2025		07/04/2025	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango (CC-16)											
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coban (CC-18)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/09/2025		15/09/2025		29/09/2025		13/10/2025		27/10/2025	
<b>Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>											
<b>Construcción de Sedes Departamentales</b>											
Construcción de Oficina Departamental, Construcción de 1 oficina de Sede Departamental (Quetzaltenango) LPN-08	Licitación o Concurso Público Nacional	06/10/2025		13/10/2025		17/11/2025		17/12/2025		22/12/2025	
<b>Equipamiento de Sedes Departamentales</b>											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Departamental (Quetzaltenango) LPN-06	Licitación o Concurso Público Nacional	06/11/2025		17/11/2025		19/12/2025		15/01/2026		26/01/2026	
<b>Construcción de Sedes Municipales</b>											
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango (LPN-03)	Licitación o Concurso Público Nacional	05/11/2024	18/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	30/01/2025	30/01/2025	28/02/2025		14/03/2025	
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Cobán, Alta Verapaz (LPN-05).	Licitación o Concurso Público Nacional	01/07/2025	31/03/2025	15/07/2025		18/08/2025		29/08/2025		22/09/2025	
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. (LPN-04)	Licitación o Concurso Público Nacional	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	13/08/2024	14/10/2024	14/10/2024	31/01/2025		14/02/2025	
<b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Chimaltenango) LPN-10	Licitación o Concurso Público Nacional	08/09/2025		15/09/2025		17/10/2025		14/11/2025		24/11/2025	
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficinas Municipales (Cobán, Alta Verapaz) LPN-11	Licitación o Concurso Público Nacional	19/09/2025		29/09/2025		31/10/2025		28/11/2025		17/12/2025	
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Coatepeque) LPN-09	Licitación o Concurso Público Nacional	09/06/2025		16/06/2025		17/07/2025		20/08/2025		22/09/2025	



Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Construccion Edificio Sede Central</b>											
Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)	Licitación o Concurso Público Internacional	05/09/2025		15/09/2025		03/11/2025		08/12/2025		14/01/2026	
<b>Equipamiento de Edificio Sede Central</b>											
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-02)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/09/2026		15/09/2026		02/11/2026		27/11/2026		05/01/2027	

# Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Administración</b>													
<b>Personal Contratado UEE</b>													
Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP (CC-23)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Supervisión</b>													
<b>Supervisores Contratados</b>													
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el puntode vista de estructural calidad de materiales y metodologia de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el puntode vista de estructural calidad de materiales y metodologia de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Departamento de Quetzaltenango (CC-12)													
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Coatepeque (CC-13)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Chimaltenango (CC-16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Coban (CC-18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>													
<b>Construcción de Sedes Departamentales</b>													
Construcción de Oficina Departamental, Construcción de 1 oficina de Sede Departamental (Quetzaltenango) LPN-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Equipamiento de Sedes Departamentales</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Departamental (Quetzaltenango) LPN-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Sedes Municipales</b>													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango (LPN-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Cobán Alta Verapaz (LPN-05).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. (LPN-04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Chimaltenango) LPN-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficinas Municipales (Cobán, Alta Verapaz) LPN-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Coatepeque) LPN-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Construcción Edificio Sede Central</b>													
Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Equipamiento de Edificio Sede Central</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

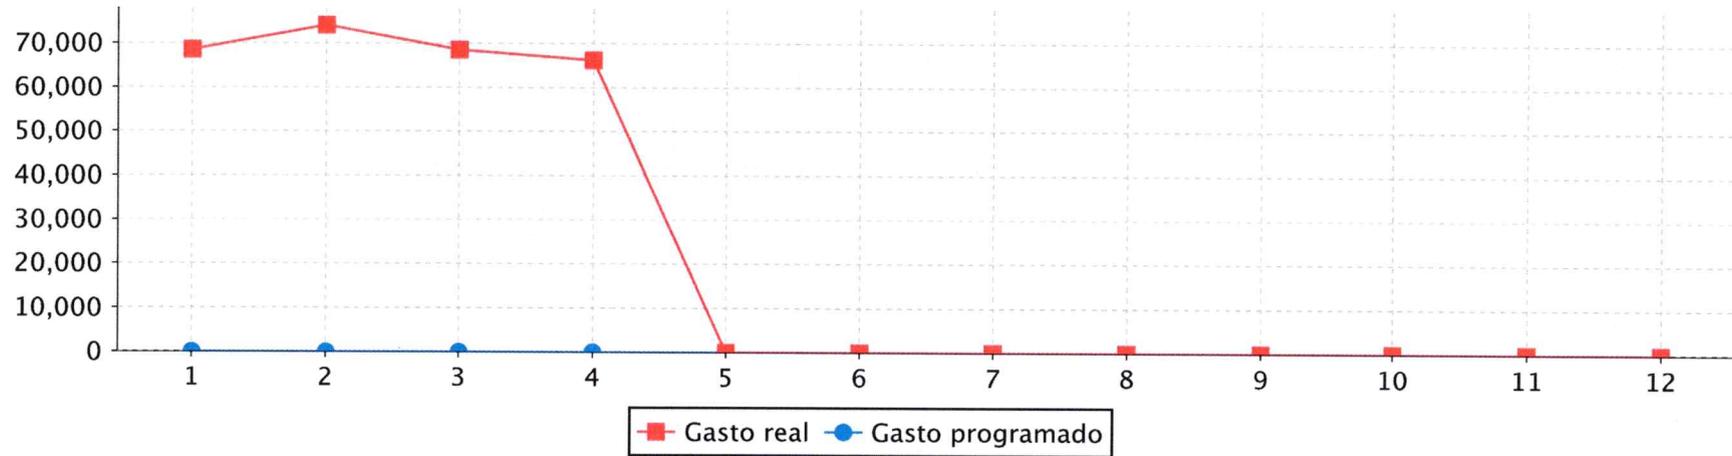

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	68,615.49	74,182.56	68,615.49	66,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Gasto real</b>												277,704.03
<b>Total Gasto programado</b>												0.00

## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programad</b>	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>Realizado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variación</b>	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00

007



## Observaciones / Desafíos

Procesos de Construcción de Obra:

CHIMALTENANGO: SEGEPLAN aprobó el 30/05/2024 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Chimaltenango" con Código SNIP 294703. Se realizó el proceso de elaboración y aprobación de las Bases de Licitación las cuales se publicaron en GUATECOMPRAS el 22/07/2024; se recibieron ofertas el 26/08/2024 y se realizó el proceso de evaluación de ofertas por el Comité de Licitación nombrado por el IDPP. Sin embargo, el informe de evaluación de ofertas concluyó en proceso fracasado.

El 29/10/2024 se solicitó al BCIE la No Objeción a las nuevas Bases de Licitación para la construcción de la Sede en Chimaltenango y el 27/11/2024 se recibió la No Objeción. Las Bases de Licitación se publicaron en el portal de GUATECOMPRAS el 01/12/2024 con NOG 24449784. El 30/1/2025 se recibieron ofertas para continuar con la fase de evaluación de ofertas realizada por el Comité de Evaluación nombrado por el IDPP y el 21/03/2025 se recibió de BCIE la No Objeción al Informe de Evaluación. Al 30/04/2025 el proceso está en análisis para la notificación de la adjudicación y proceder con la suscripción del contrato correspondiente.

COATEPEQUE: SEGEPLAN aprobó el 01/08/2024 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango" con código SNIP 294704. El 13/08/2024 se publicó en Guatecompras el proceso con NOG 2379930; se recibieron ofertas el 14/10/2024 a través de la aprobación de una segunda enmienda. Como resultado de la publicación se recibieron 5 ofertas para este proceso y las Autoridades del IDPP nombraron a un segundo Comité de Evaluación 25/11/2024 lo cual generó demora en realizar la evaluación y análisis de las ofertas que concluyó hasta el 31/01/2025. Se solicitó a BCIE la No Objeción al Informe de Evaluación y el 12/02/2025 se recibió para realizar el proceso de Notificación de Adjudicación a la empresa seleccionada. Actualmente el proceso está en análisis para la suscripción del contrato correspondiente.

COBÁN, A. V.: SEGEPLAN aprobó el 23/01/2025 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Cobán, A. V." con Código SNIP 294521. Se solicitó a BCIE la aprobación de las Bases de Licitación y el 31/03/2025 otorgó la No Objeción. Actualmente el proceso está en análisis para la publicación de las Bases de Licitación.

Procesos de Supervisión de Obra:

CHIMALTENANGO: El 05/09/2024 se recibieron las Hojas de Vida para la evaluación; sin embargo, el proceso se declaró fracasado por el Comité de Evaluación. El 27/11/2024 BCIE otorgó su No Objeción al Informe de Evaluación con resultado fracasado. El 20/02/2025 BCIE otorgó No Objeción a los nuevos Términos de Referencia; el 05/03/2025 se publicaron en GUATECOMPRAS NOG 25387359 y el 17 de marzo 2025 se recibieron las Hojas de Vida para la evaluación correspondiente. Actualmente este proceso está en análisis para realizar el proceso de evaluación correspondiente.

COATEPEQUE: NOG 18010466. El 11/10/2024 se recibieron las Hojas de Vida para la evaluación correspondiente. El 28/01/2025 BCIE otorgó la No Objeción al Informe de Evaluación para proceder con la contratación. Actualmente este proceso está en análisis para la suscripción del contrato correspondiente.

## Alertivos:

Se tiene el riesgo de que las Municipalidades de Huehuetenango y San Marcos se retracten de la donación del terreno al IDPP. En la Municipalidad de Huehuetenango argumentaron que no han realizado la donación porque no se ha iniciado la ejecución de la obra. Se solicitó reunión con el Concejo Municipal y al Señor Alcalde para solicitar audiencia y tratar el tema de la ampliación del tiempo de la donación del terreno. Actualmente no se ha tenido ninguna respuesta por parte de las Autoridades de la Municipalidad, tanto hacia la Unidad Especial de Ejecución del Programa BCIE como a la Coordinación del IDPP en esa región. En el caso de San Marcos está pendiente que el Concejo Municipal conceda la ampliación del acta de donación del terreno hacia el IDPP haciendo constar que existe una diferencia entre el área física donada y el área registrada legalmente.

Elaborado por: (nombre y firma) LUIS FERNANDO VÁSQUEZ ALFARO

  
Ing. Luis Fernando Vásquez Alfaro  
Consultor de Infraestructura  
IDPP-UEEP-BCIE-2181  
Guatemala, Guatemala 007



Aprobado por: (nombre y firma) Licda. Lesbia Carolina Ochoa Cetino



Licda. Carolina Ochoa Cetino  
Directora  
División Administrativa y Financiera  
Instituto de la Defensa Pública Penal  
Guatemala, Guatemala 067

Fecha de actualización

9/5/2025 - 3:31 PM
