



# INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Guatemala, C.A.

Unidad Especial de Ejecución

Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Préstamo BCIE 2181



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL  
*Defendemos sus derechos, actuamos con transparencia*

Guatemala, 11 de agosto de 2025

Ref.: UEEP-PIMSJ-BCIE2181/Coordinación/JRHJ/Ifva

Oficio No. 065-2025

Licenciado

Byron Morales López

Unidad de Información Pública del Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP–

En Funciones


Su Despacho

Estimado Licenciado Morales:

En cumplimiento a la instrucción emanada en el Artículo 73. Planes de Ejecuciones Anuales de Préstamos Externos, del Decreto 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco (2025). En ese sentido se adjunta en formato impreso el PLAN ANUAL DE EJECUCION correspondiente al MES DE JULIO 2025 del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, préstamo BCIE 2181, en proceso de ejecución por el instituto de la Defensa Pública Penal, se adjunta un CD que contiene el formato PDF del informe a publicar. Esperando que la información cumpla con los requisitos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo el apoyo de siempre, me suscribo.

Atentamente.

  
Ing. Jaime Raúl Hernández Juárez  
Coordinador de la Unidad  
IDPP-UEEP-BCIE 2181  
Instituto de la Defensa Pública Penal  
Guatemala, Guatemala 055

C.c. Licenciada Lesbia Carolina Ochoa Cetino,  
Directora de la División Administrativa y Financiera del IDPP  
C.c. Archivo

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Julio / 2025**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA**

Organismo ejecutor: **Instituto de la Defensa Pública Penal**

Número de Préstamo	BCIE-2181	Fecha de última actualización	08/08/2025
Código Presupuestario	5204010071	Fecha del Decreto	20/05/2020
Organismo Financiero	BCIE	Fecha de Suscripción	20/05/2020
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	20/05/2020
Monto contratado	300,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	28/12/2020
Monto contratado Entidad ejecutora	20,000,000.00	Fecha de cierre actual	20/05/2026
Monto Entidad Ejecutora Dolares	20,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	153,378,000.00	Plazo de ejecución	87.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,085,573.94 10.43%	Monto por desembolsar USD\$	17,914,426.06 89.57%

Gráfica de Ejecución

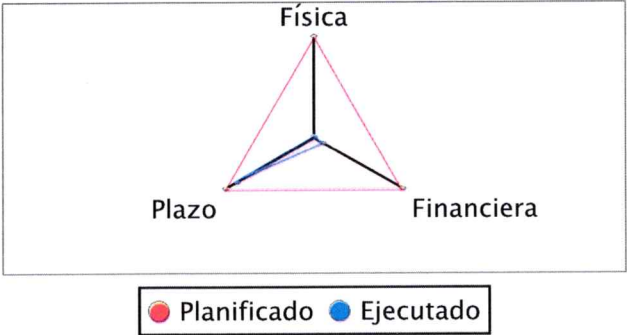

Tipo de cambio: 7.6689 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Julio		Indicadores de Avance Anuales 2025		Total	
Asignación Presupuestaria anual	29,400,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	29,400,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 50.00%		
Presupuesto Devengado	482,775.50	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	1.64%	Próximo desembolso del mes	Octubre	Plazo de ejecucion Actual	87.00%		
		Presupuesto planificado próximo	2,500,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	5.8800		



## Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Administración									
Personal Contratado UEE	Unidad	0		1		0		1	
Componente: Supervisión									
Supervisores Contratados	Unidad	1	1	2		3		6	1
Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento									
Construccion de Sedes Departamentales	Unidad	0		0		1		1	
Construccion de Sedes Municipales	Unidad	1		1		1		3	
Equipamiento de Sedes Municipales	Unidad	0		1		2		3	
Construccion Edificio Sede Central	Unidad	0		0		1		1	
Equipamiento de Sede Departamental	Unidad	0		0		1		1	



## Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Administración											
Personal Contratado UEE											
Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP (CC-23)	Comparación de Precios o Calificaciones	31/01/2025		24/02/2025		10/03/2025		25/03/2025		01/04/2025	
Supervisión											
Supervisores Contratados											
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el puntode vista de estructural calidad de materiales y metodologia de trabajo,así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-10)	Comparación de Precios o Calificaciones	03/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		08/12/2025		22/12/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el puntode vista de estructural calidad de materiales y metodologia de trabajo,así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-11)	Comparación de Precios o Calificaciones	03/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		08/12/2025		22/12/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento de Quetzaltenango (CC-12)	Comparación de Precios o Calificaciones	06/10/2025		13/10/2025		27/10/2025		10/11/2025		24/11/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque (CC-13)	Comparación de Precios o Calificaciones	19/08/2024	19/08/2024	26/09/2024	26/09/2024	21/10/2024	21/10/2024	20/01/2025	28/01/2025	24/02/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción Edificio Sede	Comparación de Precios o Calificaciones	28/01/2025		25/02/2025		17/03/2025		28/03/2025		07/04/2025	



Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango (CC-16)											
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coban (CC-18)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/09/2025		15/09/2025		29/09/2025		13/10/2025		27/10/2025	
Inversión en Infraestructura y Equipamiento											
Construcción de Sedes Departamentales											
Construcción de Oficina Departamental, Construcción de 1 oficina de Sede Departamental (Quetzaltenango) LPN-08	Licitación o Concurso Público Nacional	06/10/2025		13/10/2025		17/11/2025		17/12/2025		22/12/2025	
Equipamiento de Sedes Departamentales											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Departamental (Quetzaltenango) LPN-06	Licitación o Concurso Público Nacional	06/11/2025		17/11/2025		19/12/2025		15/01/2026		26/01/2026	
Construcción de Sedes Municipales											
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango (LPN-03)	Licitación o Concurso Público Nacional	05/11/2024	18/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	30/01/2025	30/01/2025	28/02/2025		14/03/2025	
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Cobán, Alta Verapaz (LPN-05).	Licitación o Concurso Público Nacional	01/07/2025	31/03/2025	15/07/2025		18/08/2025		29/08/2025		22/09/2025	
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. (LPN-04)	Licitación o Concurso Público Nacional	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	13/08/2024	14/10/2024	14/10/2024	31/01/2025		14/02/2025	
Equipamiento de Sedes Municipales											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Chimaltenango) LPN-10	Licitación o Concurso Público Nacional	08/09/2025		15/09/2025		17/10/2025		14/11/2025		24/11/2025	
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficinas Municipales (Cobán, Alta Verapaz) LPN-11	Licitación o Concurso Público Nacional	19/09/2025		29/09/2025		31/10/2025		28/11/2025		17/12/2025	
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Coatepeque) LPN-09	Licitación o Concurso Público Nacional	09/06/2025		16/06/2025		17/07/2025		20/08/2025		22/09/2025	



0004

Adqusiición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Construccion Edificio Sede Central											
Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)	Licitación o Concurso Público Internacional	05/09/2025		15/09/2025		03/11/2025		08/12/2025		14/01/2026	
Equipamiento de Edificio Sede Central											
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-02)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/09/2026		15/09/2026		02/11/2026		27/11/2026		05/01/2027	



## Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Administración</b>													
<b>Personal Contratado UEE</b>													
Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP (CC-23)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Supervisión</b>													
<b>Supervisores Contratados</b>													
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el puntode vista de estructural calidad de materiales y metodologia de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el puntode vista de estructural calidad de materiales y metodologia de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0005




[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango (LPN-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Cobán, Alta Verapaz (LPN-05).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. (LPN-04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Chimaltenango) LPN-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficinas Municipales (Cobán, Alta Verapaz) LPN-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Coatepeque) LPN-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Construcción Edificio Sede Central</b>													
Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Equipamiento de Edificio Sede Central</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0006




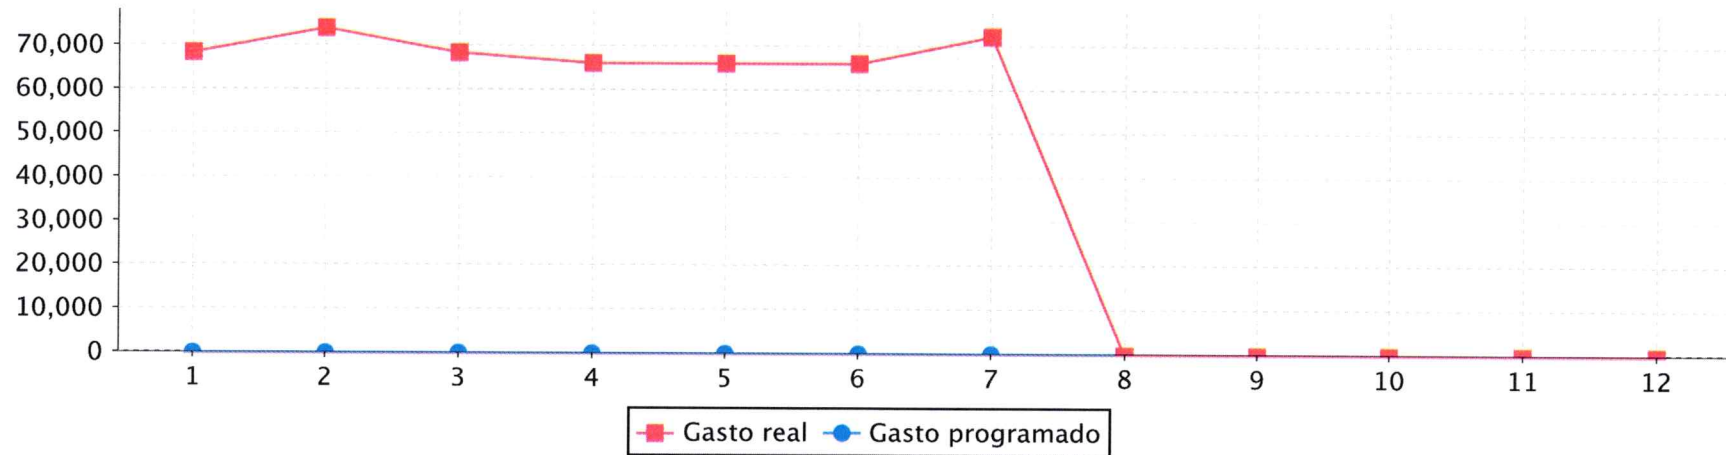

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	68,615.49	74,182.56	68,615.49	66,290.49	66,290.49	66,290.49	72,490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real			482,775.50									
Total Gasto programado			0.00									

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00





## Observaciones / Desafíos

### Procesos de Construcción de Obra:

CHIMALTENANGO: SEGEPLAN aprobó el 30/05/2024 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Chimaltenango" con Código SNIP 294703. Se realizó el proceso de elaboración y aprobación de las Bases de Licitación las cuales se publicaron en GUATECOMPRAS el 22/07/2024; se recibieron ofertas el 26/08/2024 y se realizó el proceso de evaluación de ofertas por el Comité de Licitación nombrado por el IDPP. Sin embargo, el informe de evaluación de ofertas concluyó en proceso fracasado.

El 29/10/2024 se solicitó al BCIE la No Objeción a las nuevas Bases de Licitación para la construcción de la Sede en Chimaltenango y el 27/11/2024 se recibió la No Objeción. Las Bases de Licitación se publicaron en el portal de GUATECOMPRAS el 01/12/2024 con NOG 24449784. El 30/1/2025 se recibieron ofertas para continuar con la fase de evaluación de ofertas realizada por el Comité de Evaluación nombrado por el IDPP y el 21/03/2025 se recibió de BCIE la No Objeción al Informe de Evaluación. Al 30/04/2025 el proceso está en análisis para la notificación de la adjudicación y proceder con la suscripción del contrato correspondiente.

COATEPEQUE: SEGEPLAN aprobó el 01/08/2024 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango" con código SNIP 294704. El 13/08/2024 se publicó en Guatecompras el proceso con NOG 2379930; se recibieron ofertas el 14/10/2024 a través de la aprobación de una segunda enmienda. Como resultado de la publicación se recibieron 5 ofertas para este proceso y las Autoridades del IDPP nombraron a un segundo Comité de Evaluación 25/11/2024 lo cual generó demora en realizar la evaluación y análisis de las ofertas que concluyó hasta el 31/01/2025. Se solicitó a BCIE la No Objeción al Informe de Evaluación y el 12/02/2025 se recibió para realizar el proceso de Notificación de Adjudicación a la empresa seleccionada con oficio No. UEE-PIMSJ-BCIE-ADMON 008-2025/cvg de fecha 20 de marzo 2025. Actualmente el proceso está en análisis para la suscripción del contrato correspondiente.

COBÁN, A. V.: SEGEPLAN aprobó el 23/01/2025 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Cobán, A. V." con Código SNIP 294521. Se solicitó a BCIE la aprobación de las Bases de Licitación y el 31/03/2025 otorgó la No Objeción. Actualmente el proceso está en análisis para la publicación de las Bases de Licitación.

Jalapa, Jalapa.: SEGEPLAN aprobó el 25/07/2025 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Jalapa" con Código SNIP 294525. Se trabaja en los términos de referencia para las Bases de Licitación

### Procesos de Supervisión de Obra:

CHIMALTENANGO: El 05/09/2024 se recibieron las Hojas de Vida para la evaluación; sin embargo, el proceso se declaró fracasado por el Comité de Evaluación. El 27/11/2024 BCIE otorgó su No Objeción al Informe de Evaluación con resultado fracasado. El 20/02/2025 BCIE otorgó No Objeción a los nuevos Términos de Referencia; el 05/03/2025 se publicaron en GUATECOMPRAS NOG 25387359 y el 17 de marzo 2025 se recibieron las Hojas de Vida para la evaluación correspondiente. Actualmente este proceso está en análisis para realizar el proceso de evaluación correspondiente.

COATEPEQUE: NOG 18010466. El 11/10/2024 se recibieron las Hojas de Vida para la evaluación correspondiente. El 28/01/2025 BCIE otorgó la No Objeción al Informe de Evaluación para proceder con la contratación. Actualmente este proceso está en análisis para la suscripción del contrato correspondiente.

## Alertivos:

Se tiene el riesgo de que las Municipalidades de Huehuetenango y San Marcos se retracten de la donación del terreno al IDPP. En la Municipalidad de Huehuetenango argumentaron que no han realizado la donación porque no se ha iniciado la ejecución de la obra. Se solicitó reunión con el Concejo Municipal y al Señor Alcalde para solicitar audiencia y tratar el tema de la ampliación del tiempo de la donación del terreno. Actualmente no se ha tenido ninguna respuesta por parte de las Autoridades de la Municipalidad, tanto hacia la Unidad Especial de Ejecución del Programa BCIE como a la Coordinación del IDPP en esa región. En el caso de San Marcos está pendiente que el Concejo Municipal conceda la ampliación del acta de donación del terreno hacia el IDPP haciendo constar que existe una diferencia entre el área física donada y el área registrada legalmente.



0008

Elaborado por: (nombre y firma) LUIS FERNANDO VÁSQUEZ ALFARO

  
Ing. Luis Fernando Vásquez Alfaro  
Consultor de Infraestructura  
IDPP-UEEP-BCIE 2181  
Guatemala, Guatemala 007

Aprobado por: (nombre y firma) Licda. Lesbia Carolina Ochoa Cetino.

  
Licda. Carolina Ochoa Cetino  
Directora  
División Administrativa y Financiera  
Instituto de la Defensa Pública Penal  
Guatemala, Guatemala 068



Fecha de actualización

8/8/2025 - 3:16 PM
