



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Guatemala, C.A.

Unidad Especial de Ejecución

Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia
Préstamo BCIE 2181



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
Defender a los ciudadanos, reformar las leyes, mejorar

Guatemala, 9 de septiembre de 2025
Ref.: UEEP-PIMSJ-BCIE2181/Coordinación/JRHJ/lfva
Oficio No. 119-2025

Licenciado

José Roberto Ismalej Guzmán

Encargado Información Pública

Instituto de la Defensa Pública Penal

Su Despacho

Estimado Lic. Ismalej:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos al frente de sus labores diarias.


En cumplimiento a la instrucción emanada en el **Artículo 73. Planes de Ejecuciones Anuales de Préstamos Externos**, del Decreto 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco (2025). En ese sentido se adjunta en formato impreso el **PLAN ANUAL DE EJECUCION** correspondiente al **MES DE AGOSTO 2025** del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, préstamo BCIE 2181, en proceso de ejecución por el instituto de la Defensa Pública Penal, se adjunta un CD que contiene el formato PDF, el informe a publicar. Esperando que la información sea de utilidad para el seguimiento de ustedes.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

Sin otro particular, nos suscribimos. Atentamente,


Ing. Luis Fernando Vásquez Alfaro
Consultor de Infraestructura
IDPP-UEEP-BCIE 2181
Guatemala, Guatemala 007


Ing. Jaime Raúl Hernández Juárez
Coordinador de la Unidad
IDPP-UEEP-BCIE 2181
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 055

Cc Archivo

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Agosto / 2025**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA**


Organismo ejecutor: **Instituto de la Defensa Pública Penal**

Número de Préstamo	BCIE-2181	Fecha de última actualización	09/09/2025
Código Presupuestario	5204010071	Fecha del Decreto	20/05/2020
Organismo Financiero	BCIE	Fecha de Suscripción	20/05/2020
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	20/05/2020
Monto contratado	300,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	28/12/2020
Monto contratado Entidad ejecutora	20,000,000.00	Fecha de cierre actual	20/05/2026
Monto Entidad Ejecutora Dolares	20,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	153,214,000.00	Plazo de ejecución	88.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,085,573.94	10.43%	Monto por desembolsar USD\$ 17,914,426.06 89.57%

Gráfica de Ejecución

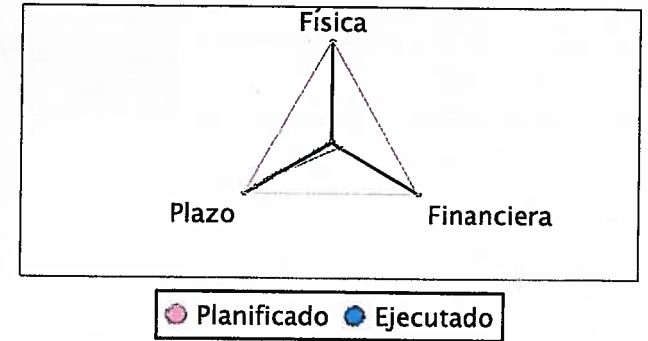

Tipo de cambio: 7.6607 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2025		Total	
Asignación Presupuestaria anual	29,400,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	29,400,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 50.00%		
Presupuesto Devengado	551,390.99	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	1.88%	Próximo desembolso del mes	Octubre	Plazo de ejecucion Actual	88.00%		
		Presupuesto planificado próximo	2,500,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	5.8800		

Metas año fiscal


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Administración									
Personal Contratado UEE	Unidad	0		1		0		1	
Componente: Supervisión									
Supervisores Contratados	Unidad	1	1	2		3		6	1
Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento									
Construcción de Sedes Departamentales	Unidad	0		0		1		1	
Construcción de Sedes Municipales	Unidad	1		1		1		3	
Equipamiento de Sedes Municipales	Unidad	0		1		2		3	
Construcción Edificio Sede Central	Unidad	0		0		1		1	
Equipamiento de Sede Departamental	Unidad	0		0		1		1	



Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Administración											
Personal Contratado UEE											
Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP (CC-23)	Comparación de Precios o Calificaciones	31/01/2025		24/02/2025		10/03/2025		25/03/2025		01/04/2025	
Supervisión											
Supervisores Contratados											
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-10)	Comparación de Precios o Calificaciones	03/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		08/12/2025		22/12/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-11)	Comparación de Precios o Calificaciones	03/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		08/12/2025		22/12/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento de Quetzaltenango (CC-12)	Comparación de Precios o Calificaciones	06/10/2025		13/10/2025		27/10/2025		10/11/2025		24/11/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque (CC-13)	Comparación de Precios o Calificaciones	19/08/2024	19/08/2024	26/09/2024	26/09/2024	21/10/2024	21/10/2024	20/01/2025	28/01/2025	24/02/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede	Comparación de Precios o Calificaciones	28/01/2025		25/02/2025		17/03/2025		28/03/2025		07/04/2025	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango (CC-16)											
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coban (CC-18)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/09/2025		15/09/2025		29/09/2025		13/10/2025		27/10/2025	
Inversión en Infraestructura y Equipamiento											
Construcción de Sedes Departamentales											
Construcción de Oficina Departamental, Construcción de 1 oficina de Sede Departamental (Quetzaltenango) LPN-08	Licitación o Concurso Público Nacional	06/10/2025		13/10/2025		17/11/2025		17/12/2025		22/12/2025	
Equipamiento de Sedes Departamentales											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Departamental (Quetzaltenango) LPN-06	Licitación o Concurso Público Nacional	06/11/2025		17/11/2025		19/12/2025		15/01/2026		26/01/2026	
Construcción de Sedes Municipales											
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango (LPN-03)	Licitación o Concurso Público Nacional	05/11/2024	18/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	30/01/2025	30/01/2025	28/02/2025		14/03/2025	
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Cobán, Alta Verapaz (LPN-05).	Licitación o Concurso Público Nacional	01/07/2025	31/03/2025	15/07/2025		18/08/2025		29/08/2025		22/09/2025	
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. (LPN-04)	Licitación o Concurso Público Nacional	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	13/08/2024	14/10/2024	14/10/2024	31/01/2025		14/02/2025	
Equipamiento de Sedes Municipales											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Chimaltenango) LPN-10	Licitación o Concurso Público Nacional	08/09/2025		15/09/2025		17/10/2025		14/11/2025		24/11/2025	
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficinas Municipales (Cobán, Alta Verapaz) LPN-11	Licitación o Concurso Público Nacional	19/09/2025		29/09/2025		31/10/2025		28/11/2025		17/12/2025	
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Coatepeque) LPN-09	Licitación o Concurso Público Nacional	09/06/2025		16/06/2025		17/07/2025		20/08/2025		22/09/2025	




Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Construcción Edificio Sede Central											
Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)	Licitación o Concurso Público Internacional	05/09/2025		15/09/2025		03/11/2025		08/12/2025		14/01/2026	
Equipamiento de Edificio Sede Central											
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-02)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/09/2026		15/09/2026		02/11/2026		27/11/2026		05/01/2027	

Ejecución Financiera Anual

Ítem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Administración													
Personal Contratado UEE													
Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP (CC-23)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión													
Supervisores Contratados													
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


0004




Insujino	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Departamento de Quetzaltenango (CC-12)													
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Coatepeque (CC-13)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Chimaltenango (CC-16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Coban (CC-18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión en Infraestructura y Equipamiento													
Construcción de Sedes Departamentales													
Construcción de Oficina Departamental, Construcción de 1 oficina de Sede Departamental (Quetzaltenango) LPN-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamiento de Sedes Departamentales													
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Departamental (Quetzaltenango) LPN-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de Sedes Municipales													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango (LPN-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Cobán Alta Verapaz (LPN-05).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. (LPN-04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamiento de Sedes Municipales													
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Chimaltenango) LPN-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficinas Municipales (Cobán, Alta Verapaz) LPN-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Coatepeque) LPN-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción Edificio Sede Central													
Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamiento de Edificio Sede Central													
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0005



Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

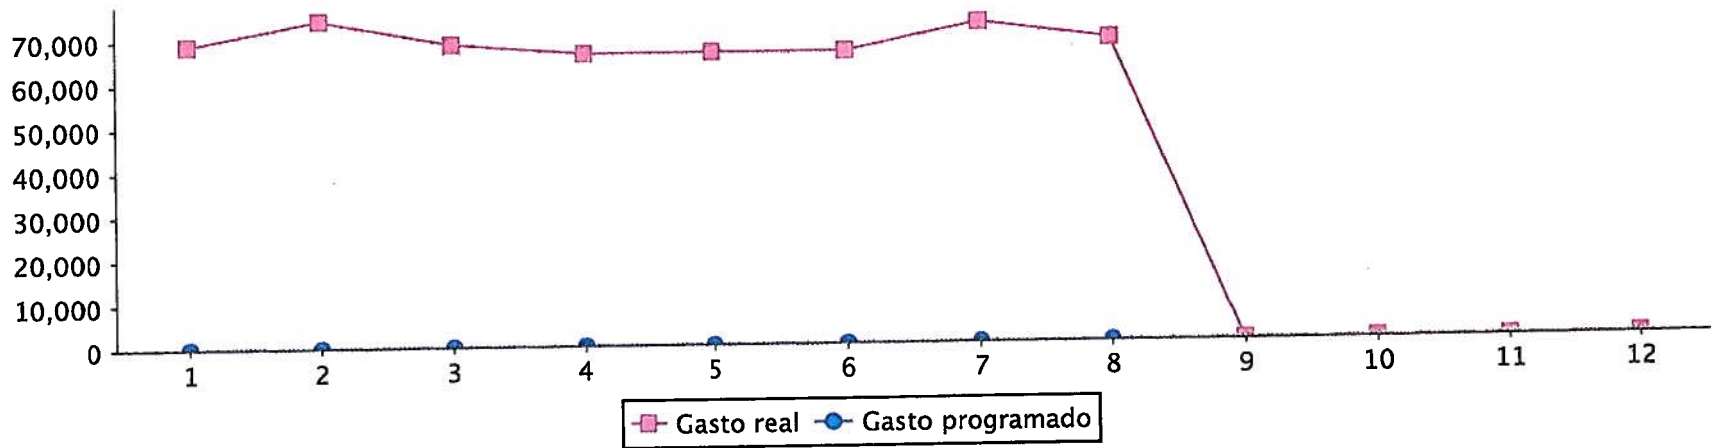

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	68,615.49	74,182.56	68,615.49	66,290.49	66,290.49	66,290.49	72,490.49	68,615.49	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real	551,390.99											
Total Gasto programado	0.00											

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00

0006



Observaciones / Desafíos

Procesos de Construcción de Obra:

CHIMALTENANGO: SEGEPLAN aprobó el 30/05/2024 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Chimaltenango" con Código SNIP 294703.

El 29/10/2024 se solicitó al BCIE la No Objeción a las nuevas Bases de Licitación para la construcción de la Sede en Chimaltenango y el 27/11/2024 se recibió la No Objeción.

El 26 de agosto 2025 se publicó intención de adjudicación según lo establecido en la sección I.IAO 41.1 de los DDL, enviadas el 24/03/2025 a los oferentes, por los funcionarios designados en dichas fechas, el plazo para protestas ya venció y los interesados estaban informados, se publica para regularizar el evento en proceso de revisión para contratación.

COATEPEQUE: SEGEPLAN aprobó el 01/08/2024 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango" con código SNIP 294704. El 13/08/2024 se publicó en Guatecompras el proceso con NOG 23799307; se recibieron ofertas el 14/10/2024 a través de la aprobación de una segunda enmienda. Se solicitó a BCIE la No Objeción al Informe de Evaluación y el 12/02/2025 se recibió para realizar el proceso de Notificación de Adjudicación a la empresa seleccionada con oficio No. UEE-PIMSJ-BCIE-ADMON 008-2025/cvg de fecha 20 de marzo 2025. Se Publica el 22 de agosto 2025, intención de adjudicación según lo establecido en la sección I.IAO 41.1 de los DDL, enviadas el 12/02/2025 a los oferentes, por los funcionarios designados en dichas fechas, el plazo para protestas ya venció y los interesados estaban informados, se publica para regularizar el evento en proceso de revisión para contratación.

COBÁN, A. V.: SEGEPLAN aprobó el 23/01/2025 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Cobán, A. V." con Código SNIP 294521. Se solicitó a BCIE la aprobación de las Bases de Licitación y el 31/03/2025 otorgó la No Objeción. Actualmente el proceso está en análisis para la publicación de las Bases de Licitación.

JALAPA, JALAPA.: SEGEPLAN aprobó el 25/07/1/2025 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Jalapa" con Código SNIP 294525. Se trabaja en la documentación para solicitar No Objeción del BCIE a los documentos estándar o Bases de Licitación.

Procesos de Supervisión de Obra:

CHIMALTENANGO.: El 05/09/2024 se recibieron las Hojas de Vida para la evaluación; Se prescindió del evento por actualización de términos de referencia. Se obtuvo la no objeción a los nuevos términos de referencia para la nueva publicación para las muestras de interés de la supervisión.


COATEPEQUE: NOG 18010466. Se prescindió del evento por actualización de términos de referencia. Se publicó exitosamente el 03 de septiembre un nuevo proceso NOG 27691101

Alertivos:

Procesos de Construcción de Obra:

En el caso de Huehuetenango, se alertó de riesgo de que la Municipalidad de Huehuetenango se retractara de la donación gratuita del terreno al Instituto de la Defensa Pública Penal; lo cual fue confirmado al recibir certificación del acta 190-2025 de fecha 11 de agosto 2025, donde El Alcalde Municipal y el Concejo Municipal revocan la donación gratuita a favor del Instituto de la Defensa Pública Penal.

En el caso de San Marcos, a finales de agosto se envió un oficio a Concejo Municipal para el seguimiento al proceso de rectificación de área física con el área legalmente registrada en el Registro General de la Propiedad 2, con la finalidad de dar seguimiento y acompañamiento al proceso a favor del



0007

Instituto de la Defensa Pública Penal.

Elaborado por: (nombre y firma) LUIS FERNANDO VÁSQUEZ ALFARO




Ing. Luis Fernando Vásquez Alfaro
Consultor de Infraestructura
IDPP-UEEP-BCIE 2181
Guatemala, Guatemala 007

Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Lesbia Carolina Ochoa Cetino.



Licda. Carolina Ochoa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 06



Fecha de actualización

9/9/2025 - 9:20 AM
