



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
Guatemala, C.A.
Unidad Especial de Ejecución
Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia
Préstamo BCIE 2181



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PEN
Defendiendo con credencia, actuando con transparencia

Guatemala 16 de enero de 2026
Ref.: UEEP-PIMSJ-BCIE2181/Coordinación/JRHJ/jrhj
Oficio No. 029-2026

Ingeniera
Claudia González Aguilar
Directora de Crédito Público
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Su Despacho

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
CENTRO SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECEBIDO
16 ENE 2026

Hora: 14:58 Firma: _____

Registro Único de Expediente: _____


Estimado Ingeniera González:


Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos al frente de sus labores diarias.

En cumplimiento a la instrucción emanada en el Artículo 70. Plan de Ejecución Anual de Préstamos Externos, del Decreto número 054-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco (2025). En ese sentido, se adjunta en formato impreso y digital del Plan Anual de Ejecución correspondiente al Tercer cuatrimestre, período de septiembre a diciembre de 2025 del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, Préstamo BCIE 2181, en proceso de ejecución por el Instituto de la Defensa Pública Penal.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente


Ing. Jaime Raúl Hernández Juárez
Coordinador de la Unidad
IDPP-UEEP-BCIE 2181
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 055


Licda. Carolina Ochoa Celino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 067



Cc Archivo



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Guatemala, C.A.

Unidad Especial de Ejecución

Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Préstamo BCIE 2181



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
Defendamos con coraje, actuemos con responsabilidad

Guatemala 16 de enero de 2026

Ref.: UEEP-PIMSJ-BCIE2181/Coordinación/JRHJ/jrhj

Oficio No. 030-2026

Diputado

Julio Héctor Estrada

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Su Despacho


Estimado Diputado Estrada:


Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos al frente de sus labores diarias.

En cumplimiento a la instrucción emanada en el Artículo 70. Plan de Ejecución Anual de Préstamos Externos, del Decreto número 054-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco (2025). En ese sentido, se adjunta en formato impreso y digital del Plan Anual de Ejecución correspondiente al Tercer cuatrimestre, período de septiembre a diciembre de 2025 del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, Préstamo BCIE 2181, en proceso de ejecución por el Instituto de la Defensa Pública Penal.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente


Ing. Jaime Raúl Hernández Juárez
Coordinador de la Unidad
IDPP-UEEP-BCIE 2181
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 055


Licda. Carolina Ochoa Cejino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 067


CONGRESO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA

16 ENE 2026

CI/MA

HORA

Cc Archivo





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Guatemala, C.A.

Unidad Especial de Ejecución

Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Préstamo BCIE 2181



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
Defendamos con convicción, actuemos con transparencia

Guatemala 16 de enero de 2026

Ref.: UEEP-PIMSJ-BCIE2181/Coordinación/JRHJ/jrhj

Oficio No. 031-2026

Doctor

Frank Helmuth Bode Fuentes

Contralor General de Cuentas

Contraloría General de Cuentas

Su Despacho

CONTADORÍA GENERAL DE CUENTAS

SECRETARÍA GENERAL

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
16 ENE 2026

Señor Contralor General:


A las 14:58 Hrs. Lomas


Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos al frente de sus labores diarias.

En cumplimiento a la instrucción emanada en el Artículo 70. Plan de Ejecución Anual de Préstamos Externos, del Decreto número 054-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco (2025). En ese sentido, se adjunta en formato impreso y digital del Plan Anual de Ejecución correspondiente al Tercer cuatrimestre, periodo de septiembre a diciembre de 2025 del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, Préstamo BCIE 2181, en proceso de ejecución por el Instituto de la Defensa Pública Penal.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente


Ing. Jaime Raúl Hernández Juárez
Coordinador de la Unidad
IDPP-UEEP-BCIE 2181
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 055


Licda. Carolina Ochoa Celino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 067



Cc Archivo

Plan Anual de Ejecución

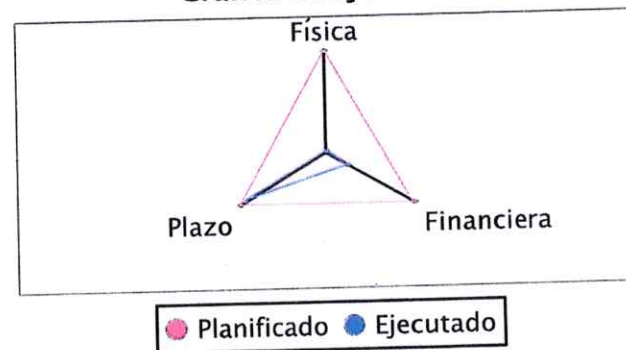
Mes reportado **Diciembre / 2025**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA**


Organismo ejecutor: **Instituto de la Defensa Pública Penal**

Número de Préstamo	BCIE-2181	Fecha de última actualización	16/01/2026
Código Presupuestario	5204010071	Fecha del Decreto	20/05/2020
Organismo Financiero	BCIE	Fecha de Suscripción	20/05/2020
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	20/05/2020
Monto contratado	300,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	28/12/2020
Monto contratado Entidad ejecutora	20,000,000.00	Fecha de cierre actual	20/05/2026
Monto Entidad Ejecutora Dolares	20,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	153,290,000.00	Plazo de ejecución	93.00%
Desembolsos realizados a la fecha	4,957,654.64 24.79%	Monto por desembolsar USD\$	15,042,345.36 75.21%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.6645 X 1 USD



[Firma manuscrita]

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2025		Total	
Asignación Presupuestaria anual	29,400,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	2872080.7	Ejecución Financiera	14.00%
Presupuesto Vigente anual	29,400,000.00	Desembolso realizado en el mes	2,872,080.70	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	57.44% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	813,346.30	Diferencia	-2,872,080.70	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	2.77%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	94.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	5.8800		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Administración									
Personal Contratado UEE	Unidad	0		1		0	0	1	0
Componente: Supervisión									
Supervisores Contratados	Unidad	1	1	2		3	1	6	2
Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento									
Construccion de Sedes Departamentales	Unidad	0		0		1		1	
Construccion de Sedes Municipales	Unidad	1		1		1		3	
Equipamiento de Sedes Municipales	Unidad	0		1		2		3	
Construccion Edificio Sede Central	Unidad	0		0		1		1	
Equipamiento de Sede Departamental	Unidad	0		0		1		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Administración											
Personal Contratado UEE											
Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP (CC-23)	Comparación de Precios o Calificaciones	31/01/2025		24/02/2025		10/03/2025		25/03/2025		01/04/2025	
Supervisión											
Supervisores Contratados											
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el puntode vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo,así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-10)	Comparación de Precios o Calificaciones	03/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		08/12/2025		22/12/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el puntode vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo,así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-11)	Comparación de Precios o Calificaciones	03/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		08/12/2025		22/12/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento de Quetzaltenango (CC-12)	Comparación de Precios o Calificaciones	06/10/2025		13/10/2025		27/10/2025		10/11/2025		24/11/2025	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque (CC-13)	Comparación de Precios o Calificaciones	19/08/2024	26/08/2025	26/09/2024	03/09/2025	21/10/2024	10/09/2025	20/01/2025	30/09/2025	24/02/2025	07/10/2025
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor,para la Construcción Edificio Sede	Comparación de Precios o Calificaciones	28/01/2025	11/09/2025	25/02/2025	12/09/2025	17/03/2025	22/09/2025	28/03/2025	13/10/2025	07/04/2025	15/10/2025

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango (CC-16)											
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coban (CC-18)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/09/2025		15/09/2025		29/09/2025		13/10/2025		27/10/2025	
Inversión en Infraestructura y Equipamiento											
Construcción de Sedes Departamentales											
Construcción de Oficina Departamental, Construcción de 1 oficina de Sede Departamental (Quetzaltenango) LPN-08	Licitación o Concurso Público Nacional	06/10/2025		13/10/2025		17/11/2025		17/12/2025		22/12/2025	
Equipamiento de Sedes Departamentales											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Departamental (Quetzaltenango) LPN-06	Licitación o Concurso Público Nacional	06/11/2025		17/11/2025		19/12/2025		15/01/2026		26/01/2026	
Construcción de Sedes Municipales											
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango (LPN-03)	Licitación o Concurso Público Nacional	05/11/2024	18/11/2024	01/12/2024	01/12/2024	30/01/2025	30/01/2025	28/02/2025	29/08/2025	14/03/2025	17/10/2025
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Cobán, Alta Verapaz (LPN-05).	Licitación o Concurso Público Nacional	01/07/2025	31/03/2025	15/07/2025		18/08/2025		29/08/2025		22/09/2025	
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. (LPN-04)	Licitación o Concurso Público Nacional	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	13/08/2024	14/10/2024	14/10/2024	31/01/2025	04/03/2025	14/02/2025	09/10/2025
Equipamiento de Sedes Municipales											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Chimaltenango) LPN-10	Licitación o Concurso Público Nacional	08/09/2025		15/09/2025		17/10/2025		14/11/2025		24/11/2025	
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficinas Municipales (Cobán, Alta Verapaz) LPN-11	Licitación o Concurso Público Nacional	19/09/2025		29/09/2025		31/10/2025		28/11/2025		17/12/2025	
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Coatepeque) LPN-09	Licitación o Concurso Público Nacional	09/06/2025		16/06/2025		17/07/2025		20/08/2025		22/09/2025	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Construccion Edificio Sede Central											
Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)	Licitación o Concurso Público Internacional	05/09/2025		15/09/2025		03/11/2025		08/12/2025		14/01/2026	
Equipamiento de Edificio Sede Central											
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-02)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/09/2026		15/09/2026		02/11/2026		27/11/2026		05/01/2027	

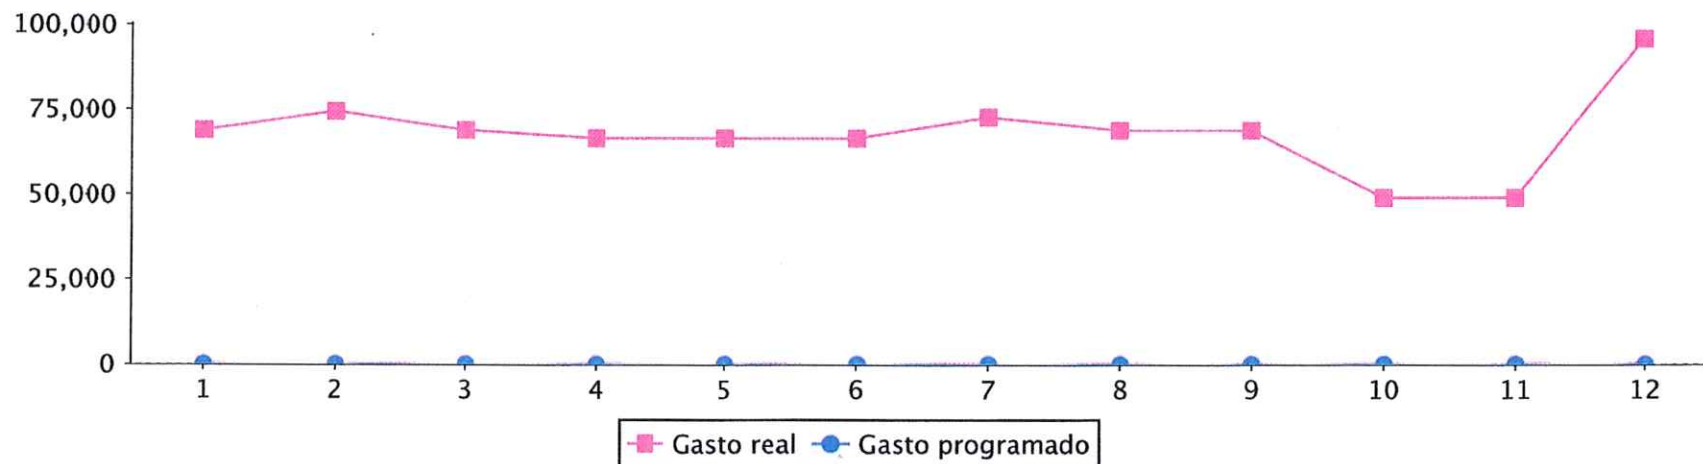
Ejecución Financiera Anual

[illegible]

[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango (LPN-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Cobán Alta Verapaz (LPN-05).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. (LPN-04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamiento de Sedes Municipales													
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Chimaltenango) LPN-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficinas Municipales (Cobán, Alta Verapaz) LPN-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Municipal (Coatepeque) LPN-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción Edificio Sede Central													
Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamiento de Edificio Sede Central													
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872,080.70
Variación	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	-2,872,080.70



Observaciones / Desafíos

CHIMALTENANGO:

Obra contratada a cargo de la empresa Consultoría y Construcción Ingenieros Asociados, Sociedad Anónima, empresa ejecutora. Licencia de construcción No. 061-2025/D.L.C./jyoc/Srita. La obra inició su plazo de ejecución formalmente el día 19/11/2025, mediante orden de inicio emitida por el supervisor (gerente de obras) Ing. Oscar Manrique Villatoro Villatoro. Actualmente la obra fue suspendida debido a que existen cableados eléctricos que deben ser trasladados hacia una nueva ubicación.

COATEPEQUE:

Obra contratada a cargo de la empresa AYC Consultoría, empresa ejecutora. Permiso de construcción No. 36-2025. La obra inició su plazo de ejecución formalmente el día 05/11/2025, mediante orden de inicio emitida por el supervisor (gerente de obras) Ing. Lester Antonio Orellana Mejía. Obra en ejecución (actualmente se realizan trabajos preliminares)

COBÁN:

Licitación Pública Nacional LPN-05-2025 para la construcción del Edificio de la Sede Municipal de Cobán, Alta Verapaz. Se recibieron ofertas y actualmente el Comité de Evaluación ya realizó el informe respectivo. Se envió al prestamista para revisión y obtención de No Objeción y seguir el proceso respectivo

JALAPA:

Licitación Pública Nacional LPN-06-2025 para la construcción del Edificio de la Sede Municipal de Jalapa. Actualmente se está en tiempo para preparación de ofertas por parte de los interesados. Se recibirán propuestas para evaluación el 07/01/2026.

FLORES, PETÉN:

Se efectuó el seguimiento del ingreso del testimonio de escritura pública al Registro de la Propiedad para su operación y registro. Se ha trabajado en el documento técnico del proyecto de preinversión para el ingreso a la plataforma SNIP de SEGEPLAN para su futura revisión y aprobación para la fase de ejecución. Al tener el documento legal del Registro de la Propiedad se agregará al documento técnico para su carga a la plataforma SNIPgt de SEGEPLAN para su evaluación.

QUETZALTENANGO:

Se realizaron gestiones en el Departamento de Catastro de la municipalidad de Quetzaltenango para la inscripción catastral del inmueble donde se construirá la sede del IDPP. Se ingresó documento técnico del proyecto de preinversión a la plataforma SNIPgt de SEGEPLAN luego de las observaciones. El expediente está en etapa de evaluación en SEGEPLAN

SEDE CENTRAL

El 31 de octubre 2025 se ingresó a CONRED el expediente para iniciar proceso de trámite de revisión de la norma NRD-2. La escritura de ampliación y corrección de la propiedad identificada por el número de finca 96, folio 195, libro 60 del libro antiguo se encuentra registrado en el Registro de la Propiedad

Alertivos:

SAN MARCOS

Se realizó el seguimiento ante el Concejo Municipal de la Municipalidad de San Marcos, San Marcos al proceso de rectificación de área física con el área legalmente registrada en el Registro General de la Propiedad 2, gestión solicitada en el oficio No. UEEP-PIMSJ-BCIE-CJ-035-2025/nl de fecha 28 de agosto de 2025. Hasta obtener la documentación legal se podrá ingresar el expediente a la SEGEPLAN

HUEHUETENANGO

El Concejo Municipal y el Alcalde de Huehuetenango retractaron la donación gratuita del terreno al IDPP, según la certificación del acta 190-2025 de fecha 11 de agosto 2025. Se hará el intento de buscar otros sitios para ejecución de nuevas sedes. Esta sede ya no se ejecutará.

Elaborado por: (nombre y firma) JAIME RAÚL HERNÁNDEZ JUÁREZ


Ing. Jaime Raúl Hernández Juárez
Coordinador de la Unidad
IDPP-UEEP-BCIE 2181
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 055

Aprobado por: (nombre y firma) Licda. Lesbia Carolina Ochoa Ceti *no*


Licda. Carolina Ochoa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 067



Fecha de actualización

16/1/2026 - 9:19 AM
