

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Octubre / 2024**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA**


Organismo ejecutor: **Instituto de la Defensa Pública Penal**

Número de Préstamo	BCIE-2181	Fecha de última actualización	07/11/2024
Código Presupuestario	5204010071	Fecha del Decreto	20/05/2020
Organismo Financiero	BCIE	Fecha de Suscripción	20/05/2020
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	20/05/2020
Monto contratado	300,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	28/12/2020
Monto contratado Entidad ejecutora	20,000,000.00	Fecha de cierre actual	20/05/2026
Monto Entidad Ejecutora Dolares	20,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	154,502,000.00	Plazo de ejecución	74.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,085,573.94	10.43%	Monto por desembolsar USD\$
			17,914,426.06
			89.57%

**Gráfica de Ejecución**

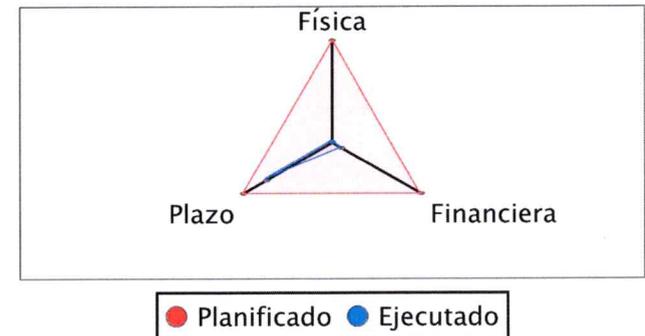

Tipo de cambio: 7.7251 X 1 USD



8

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		Indicadores de Avance Anuales 2024		Total	
Asignación Presupuestaria anual	53,547,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	90,784,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	2,021,408.39	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	4.20% / 72.56%		
Porcentaje de Ejecución	2.23%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	74.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	15.2991		



# Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Administración</b>									
Personal Contratado UEE	Unidad	1	1	0		0		1	1
<b>Componente: Supervisión</b>									
Supervisores Contratados	Unidad	0		5		5		10	
<b>Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>									
Construcción de Sedes Departamentales	Unidad	0		0		1		1	
Equipamiento de Sedes Departamentales	Unidad	0		0		1		1	
Construcción de Sedes Municipales	Unidad	0		5		2		7	
Equipamiento de Sedes Municipales	Unidad	0		5		2		7	
Construcción Edificio Sede Central	Unidad	0		0		1		1	
Equipamiento de Edificio Sede Central	Unidad	0		0		1		1	
Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central	Unidad	0		1	1	0		1	1



# Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Administración</b>											
<b>Personal Contratado UEE</b>											
Contratación de Consultor de Infraestructura (CC-21)	Comparación de Precios o Calificaciones	16/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	13/02/2024	29/01/2024	23/02/2024	31/01/2024	29/02/2024	01/02/2024	31/03/2024
<b>Supervisión</b>											
<b>Supervisores Contratados</b>											
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-10)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/09/2024		02/10/2024		07/10/2024		06/11/2024		13/11/2024	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-11)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/09/2024		02/10/2024		07/10/2024		06/11/2024		13/11/2024	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento de Quetzaltenango (CC-12)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/09/2024		01/10/2024		07/10/2024		22/10/2024		29/10/2024	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque (CC-13)	Comparación de Precios o Calificaciones	05/02/2024	19/08/2024	04/03/2024	26/09/2024	11/03/2024		26/03/2024		02/04/2024	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede	Comparación de Precios o Calificaciones	05/02/2024		04/03/2024		11/03/2024		26/03/2024		02/04/2024	



Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de San Marcos (CC-14)											
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Huehuetenango (CC-15)	Comparación de Precios o Calificaciones	05/02/2024		04/03/2024		11/03/2024		26/03/2024		02/04/2024	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango (CC-16)	Comparación de Precios o Calificaciones	05/02/2024	15/07/2024	04/03/2024	22/08/2024	04/03/2024	05/09/2024	26/03/2024		02/04/2024	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Jalapa (CC-17)	Comparación de Precios o Calificaciones	05/02/2024		04/03/2024		11/03/2024		26/03/2024		02/04/2024	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coban (CC-18)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/09/2024		01/10/2024		07/10/2024		22/10/2024		29/10/2024	
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Flores (CC-19)	Comparación de Precios o Calificaciones	02/09/2024		01/10/2024		07/10/2024		22/10/2024		29/10/2024	
<b>Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>											
<b>Construcción de Sedes Departamentales</b>											
Construcción de sede Departamental de Quetzaltenango (LPI-05)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/08/2024		04/11/2024		09/12/2024		24/01/2025		14/02/2025	
<b>Equipamiento de Sedes Departamentales</b>											
Adquisición de Mobiliario y Equio Sede Departamental de Quetzaltenango (LPN-06)	Licitación o Concurso Público Nacional	02/10/2024		14/02/2025		18/03/2025		28/03/2025		11/04/2025	
<b>Construcción de Sedes Municipales</b>											



Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Jalapa, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango. (LPI-02)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/03/2024	03/06/2024	20/03/2024	22/07/2024	30/04/2024	26/08/2024	15/05/2024		29/05/2024	
Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Cobán, Alta Verapaz y Flores, Peten. (LPI-05)	Licitación o Concurso Público Internacional	02/05/2024		04/11/2024		09/12/2024		24/01/2025		14/02/2025	
<b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>											
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Jalapa, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango. (LPI-04))	Licitación o Concurso Público Internacional	02/05/2024		14/06/2024		30/07/2024		26/08/2024		30/09/2024	
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Cobán, Alta Verapaz y Flores, Petén. (LPN-06)	Licitación o Concurso Público Nacional	02/10/2024		14/02/2025		18/03/2025		28/03/2025		11/04/2025	
<b>Construcción Edificio Sede Central</b>											
Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/10/2024		04/11/2024		20/12/2024		23/01/2025		24/02/2025	
<b>Equipamiento de Edificio Sede Central</b>											
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central de Guatemala (LPI-03)	Licitación o Concurso Público Internacional	20/12/2024		15/04/2025		30/10/2025		10/11/2025		21/11/2025	
<b>Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central</b>											
Mejora de Sede Central, Mejoramiento de las instalaciones actuales del Edificio IDPP Central (LPN-02)	Licitación o Concurso Público Nacional	01/12/2023	10/10/2023	21/12/2023	21/12/2023	30/01/2024	30/01/2024	16/02/2024	02/04/2024	29/02/2024	23/04/2024



# Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Administración</b>													
<b>Personal Contratado UEE</b>													
Contratación de Consultor de Infraestructura (CC-21)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00
Consultoría Asistente Presupuestario	15,309.48	15,309.48	15,309.48	15,309.48	15,309.48	15,309.48	15,309.48	15,309.48	15,309.48	15,309.48	15,309.48	15,309.48	183,713.76
Consultoría Asistente de PEP-POA-SNIP	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	191,537.52
Consultoría Consultor Juridico	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	191,537.52
Consultoría Asistente de Infraestructura	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	15,961.46	191,537.52
<b>Total componente</b>	<b>63,193.86</b>	<b>63,193.86</b>	<b>83,193.86</b>	<b>958,326.32</b>									
<b>Supervisión</b>													
<b>Supervisores Contratados</b>													
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central desde el punto de vista de estructural calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00



Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-11)													
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal Departamento de Quetzaltenango (CC-12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Coatepeque (CC-13)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	540,000.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de San Marcos (CC-14)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	540,000.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Huehuetenango (CC-15)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	540,000.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Chimaltenango (CC-16)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	540,000.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal,	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	540,000.00




Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Municipio de Jalapa (CC-17)													
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Coban (CC-18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
Contratación de una persona individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipio de Flores (CC-19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	480,000.00	576,000.00	3,156,000.00
<b>Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>													
<b>Construcción de Sedes Departamentales</b>													
Construcción de sede Departamental de Quetzaltenango (LPI-05)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Equipamiento de Sedes Departamentales</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equio Sede Departamental de Quetzaltenango (LPN-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Sedes Municipales</b>													
Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Jalapa, Chimaltenango Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango. (LPI-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	40,000,000.00
Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal Municipios de Cobán, Alta Verapaz y Flores, Peten (LPI-05)													
<b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Jalapa, Chimaltenango Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango. (LPI-04))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Cobán, Alta Verapaz y Flores, Petén. (LPN-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Construcción Edificio Sede Central</b>													
Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles (LPI-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Equipamiento de Edificio Sede Central</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central de Guatemala (LPI-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central</b>													
Mejora de Sede Central Mejoramiento de las instalaciones actuales del Edificio IDPP Central (LPN-02)	0.00	0.00	0.00	156,400.00	469,200.00	469,200.00	469,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,000.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	156,400.00	469,200.00	4,469,200.00	6,469,200.00	6,000,000.00	6,000,000.00	8,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	44,064,000.00
<b>Total</b>	63,193.86	63,193.86	83,193.86	539,593.86	852,393.86	4,852,393.86	6,852,393.86	6,383,193.86	6,383,193.86	8,883,193.86	6,563,193.86	6,659,193.86	48,178,326.32



## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

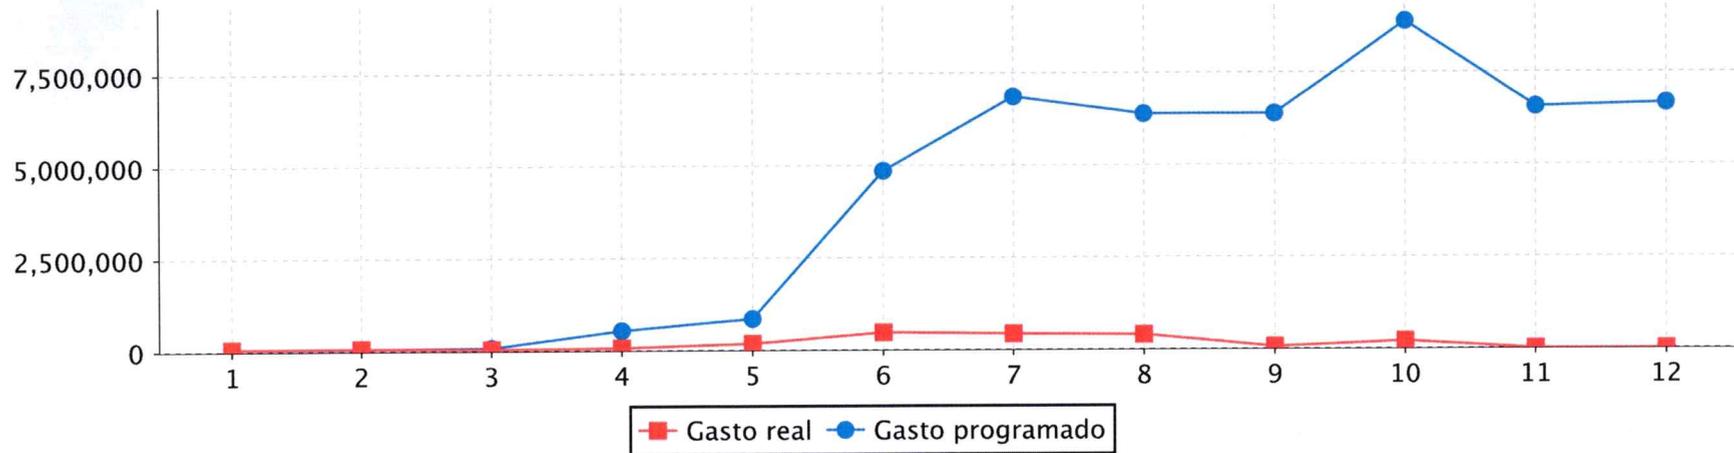

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	63,193.86	69,418.43	48,123.42	69,458.24	182,288.45	477,758.21	430,564.45	402,169.48	67,212.74	211,221.11	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	63,193.86	63,193.86	83,193.86	539,593.86	852,393.86	4,852,393.86	6,852,393.86	6,383,193.86	6,383,193.86	8,883,193.86	6,563,193.86	6,659,193.86
<b>Total Gasto real</b>												2,021,408.39
<b>Total Gasto programado</b>												48,178,326.32



## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Realizado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Observaciones / Desafíos

SEGEPLAN aprobo el 30 de mayo del 2024 , el expediente de la Sede de Chimaltenango, se público LPN-03 el 22 de julio de 2024 en GUATECOMPRAS y se recibieron ofertas el 26 de agosto de 2024, proceso fallido con ORGUA -PSD0046-2024, se solicito al BCIE la No Objeción a las nuevas Bases de Licitación Pública el 29 de octubre de 2024.

El 01 de agosto aprobo el expediente SEGEPLAN de la Sede de Coatepeque, se público el 13 de agosto de 2024 y se recibian ofertas el 17 de septiembre de 2024, se amplia dos veces para recibir ofertas, la primera al 01 de octubre y la segunda al 14 de octubre del 2024 para recibir las ofertas en las instalaciones del IDPP. Actualmente el proceso esta en evaluación por parte de la Comité Ejecutivo de Licitación nombrada por la Autoridad del el IDPP.

EL PROCESO INICIALMENTE CONTEMPLABA 5 PROYECTOS DE LAS SEDES MUNICIPALES DE CHIMALTENANGO, JALAPA, COATEPEQUE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y SAN MARCOS IDENTIFICADO PROCESO LPI-02, POR FALTA DE APROBACIÓN DE LOS CODIGOS SNIP DE ESTOS PROYECTOS, SE REALIZARON EVENTOS INDIVIDUALES IDENTIFICADOS COMO LPN-03 SEDE DE CHIMALTENANGO Y LPN-04 SEDE DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.

## Alertivos:

Se tiene el riesgo de que las municipalidades de Huehuetenango y San Marcos se retracten de la donación del terreno al IDPP, ya que en la municipalidad de Huehuetenango indican que no se ha iniciado la ejecución de la obra, se solicito reunión con el Concejo Municipal, para que amplien el tiempo de la donación de los terrenos, el cual se tuvo y no han manifestado si concederan o no la ampliación para la donación del terreno.


Para el caso de San Marcos, ya se tuvo reunión con las autoridades y se espera nuevamente el acta de donación con el nuevo levantamiento que realizo el Colegio de Ingenieros de Guatemala, para la realización de los planos de registro.

Elaborado por: (nombre y firma) Juan Carlos Linares Cruz



Ing. Juan Carlos Linares  
Coordinador de la Unidad  
IDPP -UEE - BCIE 2181

Aprobado por: (nombre y firma) Licenciada Lesbia Carolina Ochoa Cetino



Licda. Carolina Ochoa Cetino  
Directora  
División Administrativa y Financiera  
Instituto de la Defensa Pública Penal  
Guatemala, Guatemala 068

Fecha de actualización

7/11/2024 - 7:04 AM

